

# ご近隣の皆さま

## (仮称) 業平橋押上地区開発計画 (新タワー計画) H20年7・8月 工事工程のお知らせ

平成20年6月23日

(株) 大林組  
ランドソリューション(株)

(仮称) 業平橋押上地区開発計画 (新タワー計画) の建設工事につきましては、お蔭様でいよいよ7月には建築確認済証を受領次第本工事に着手し、2011年12月の竣工に向かって3年半の工事に入ります。


6月末には現場事務所が完成入居いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

7・8月の工事の主な予定は下記の通りです。

### 記

1. 地中障害撤去及び土壌対策工事
2. 杭工事及び連続地中壁杭工事  
※杭工事の手順につきましては、図-2に示します。

図-1：主な作業場所

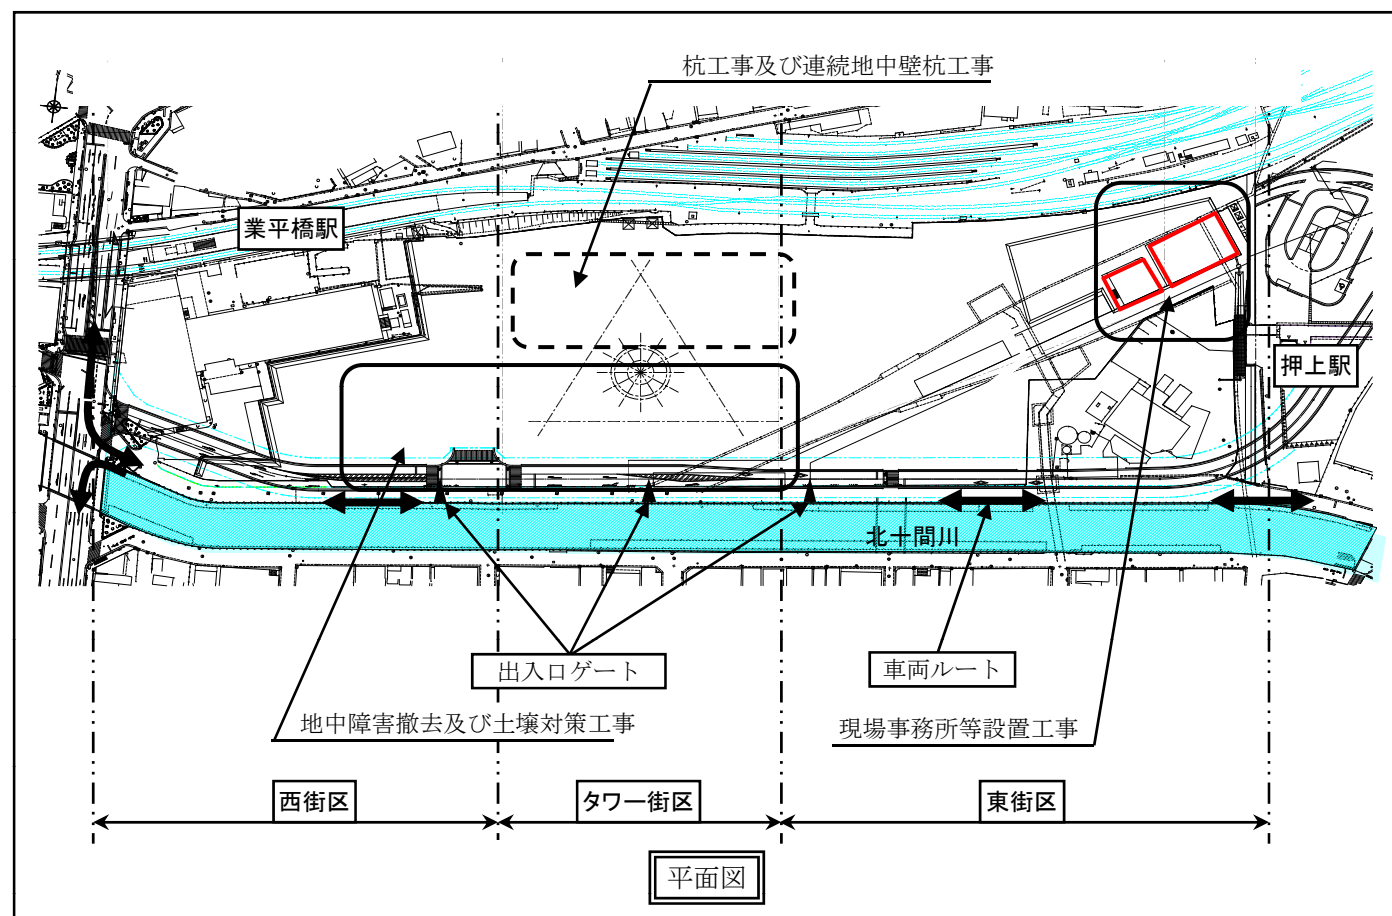


## 7・8月工事工程

	7月上旬	7月下旬	8月上旬	8月下旬	備考
<準備工事>					
① 現場事務所等設置工事	▽事務所開設				プレハブ建方 内外装工事 仮囲設置工事
② 鉄道計測機器設置工事	※6月13日設置完了				6/13以降計測しています。
③ 土壌対策工事	_____				
<本工事>					
④ 杭工事	▽本工事着工(予定)				
⑤ 連続地中壁杭工事	_____		連続地中壁杭工事		
	作業床整備及びプラント設置他準備工事				
平均車両台数(台/日)	約200台	約200台	約200台	約200台	1日当りの平均

※本工事は、上記工程で予定しておりますが、建築確認済証の受領後に着工します。

図-2：杭工事作業手順

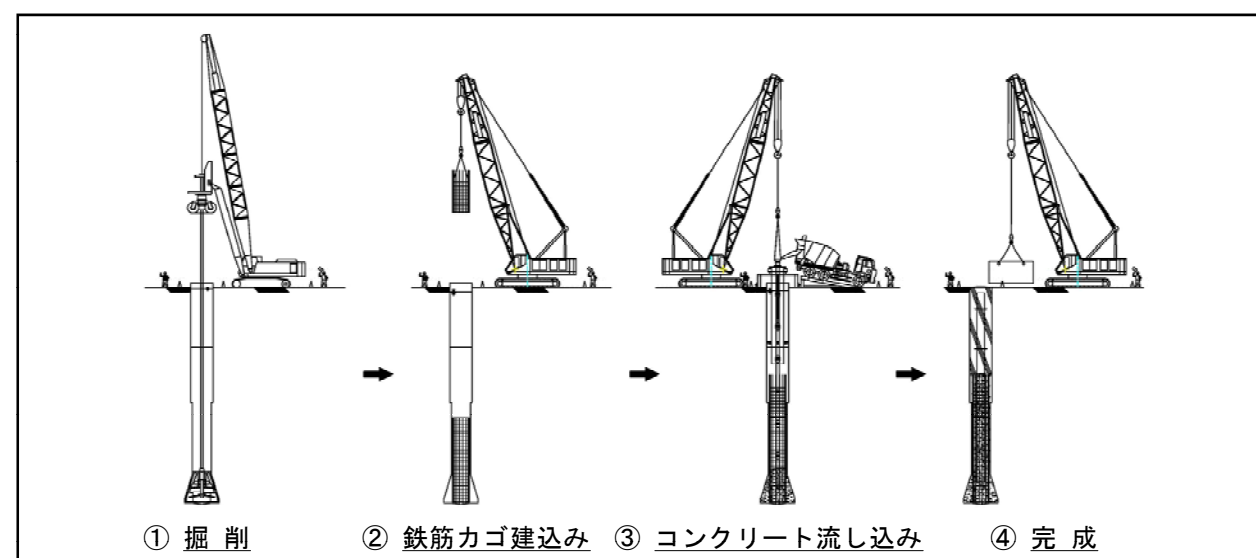

※杭工事・壁杭工事は杭の打設は行わず、地中を30～50m杭状に掘削し、鉄筋カゴ建込み、コンクリートを流し込んで進めますので、低騒音・低振動で行います。

### 【お問い合わせ先】

(仮称) 業平橋押上地区開発計画 (新タワー計画) ご相談窓口 電話：03-5610-0605
